

Gennemførelse af renoveringsarbejderne på Fortunfortet



Stilladset er sat op og byggepladshegnet er på plads



Nedrivning af den gamle beskyttelsesbeton



Nedrivning af øverste betonlag på et kanontårn



Støbejskrans fra det nordlige observationstårn



Støbejernsstige fra et observationstårn, der var indstøbt som armering i et kanontårn



Kanontårn klargjort til støbning med armeringsjern og forskalling til ventilationshul i midten af tårnet




Et næsten færdigstøbt kanontårn




Tagoverfladen med afretningslag og et færdigstøbt kanontårn



Støbning af afretningslaget på tagoverfladen udføres i mindre sektioner

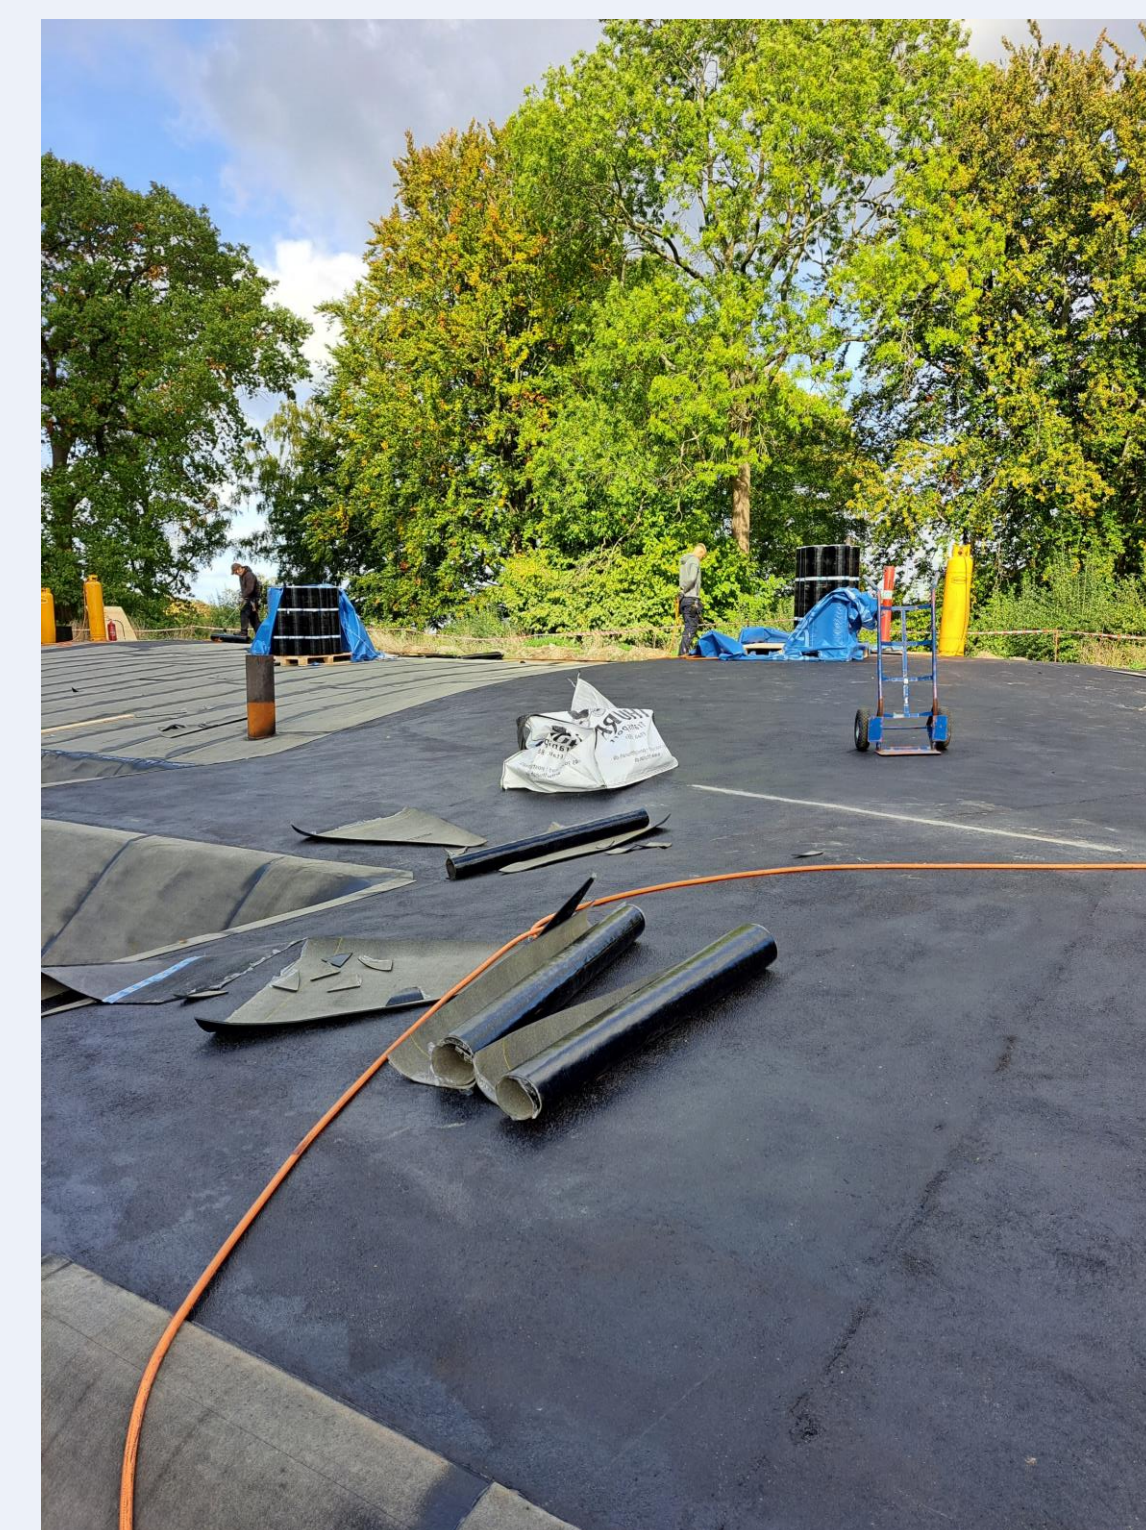

Afretningslaget på tagoverfladen er blevet primet med bitumen

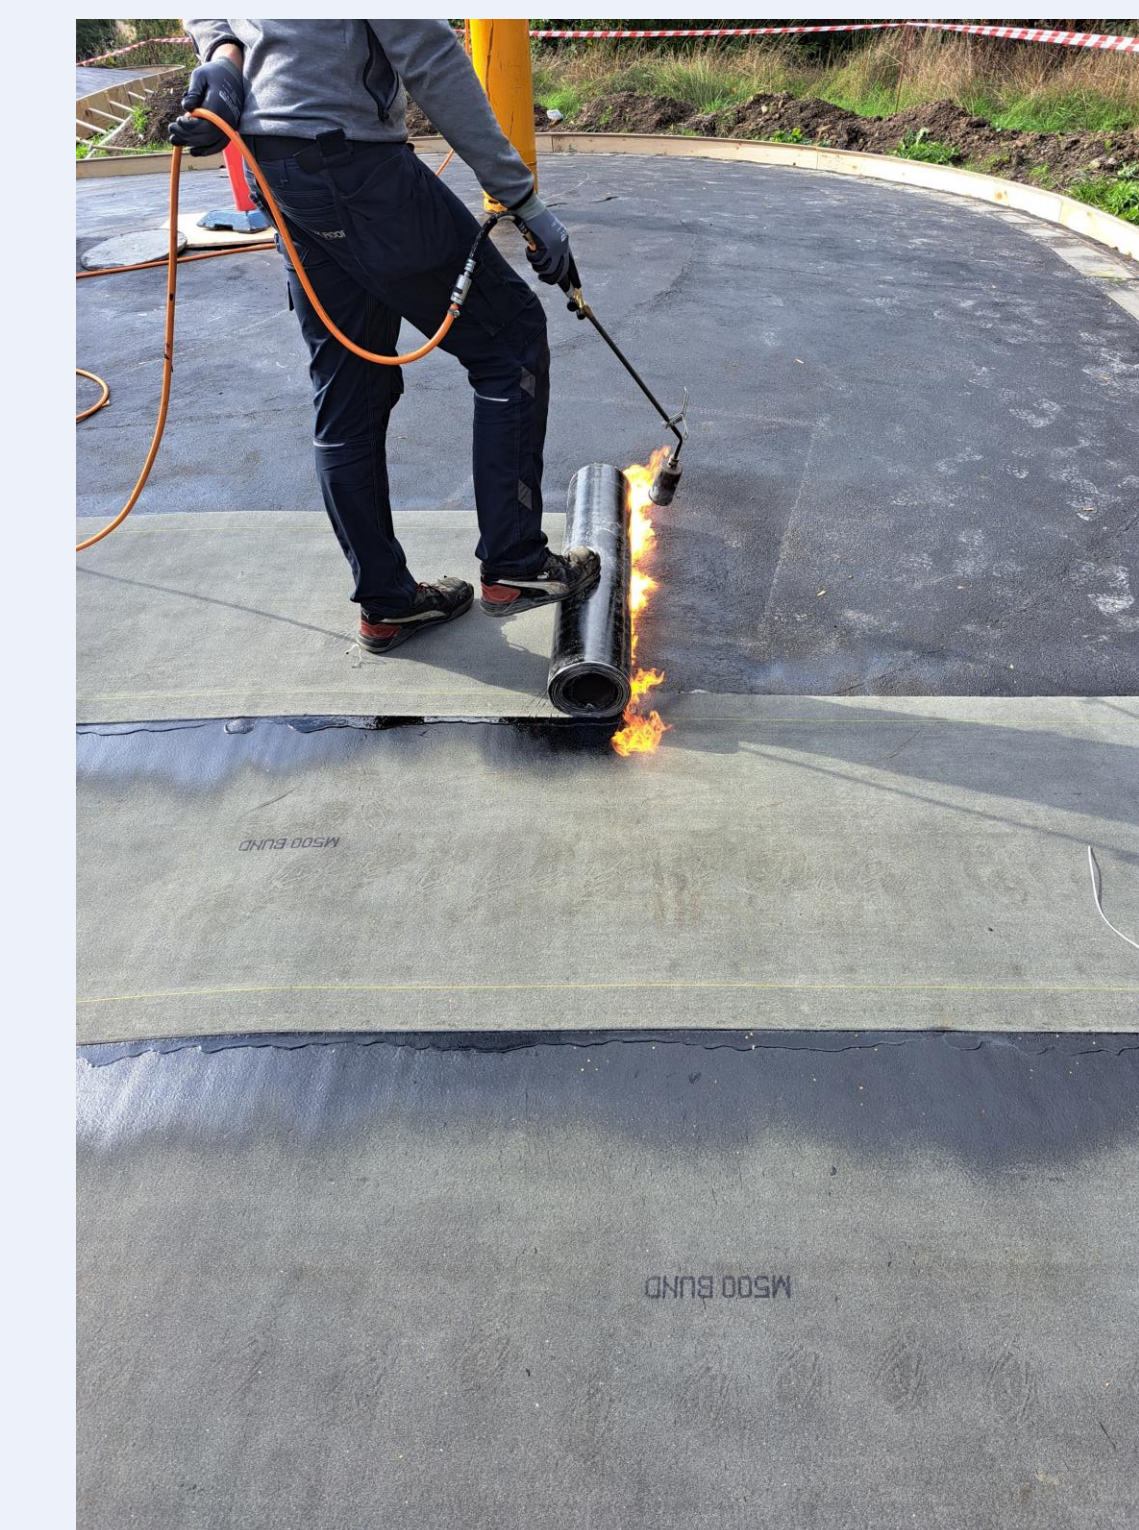

Der brændes tagpap på den primede tagoverflade



Tagoverfladen med tagpap og armeringsjern er klar til støbning



Den færdigstøbte tagoverflade



Dronefoto af støbearbejderne på fortets tag. Kun den midterste del af taget mangler at blive støbt. Der var tilkørt to betonpumper, en til hver side af fortet, så støbningen kunne foregå kontinuerligt i løbet af dagen. Dronefoto: COWI A/S



Åbning til ventilationskanal med nystøbt krans og nyt smedejernsgitter
